| IMPRESA O LAV. AUT. | Cronoprogramma | Durata |
|---|---|---|
| Nr. | Descrizione | gg |
| 1,2,3,5,6 | Verifica D.U.R.C., P.O.S. e L.U.L. | 1 |
| | IMPRESA EDILE | |
| 1,2,3,4,5,6 | Sopralluogo in cantiere | 1 |
| 1 | Allestimento generale di cantiere | 1 |
| 1 | Demolizioni e rimozioni tramezze, massetti, etc. | 20 |
| 1 | Trasporti | 5 |
| 1 | Vespai e massetti | 5 |
| 1 | Assistenze murarie | 6 |
| 1 | Pavimenti | 9 |
| | OPERE SU ASCENSORE | |
| 5 | Ordinativo e Installazione ascensore | 8 |
| | OPERE DA ELETTRICISTA | |
| 2 | Opere da elettricista | 14 |
| | IMPRESA OPERE TERMOIDRAULICHE - MECCANICHE | |
| 3 | Impresa opere termoidrauliche - meccaniche | 12 |
| | OPERE FINITURE GENERALI | |
| 6 | Pareti in cartongesso | 4 |
| 6 | Controsoffitti | 6 |
| 6 | Serramenti | 5 |
| 1,2,3,4,5,6 | Dismissione cantiere e fine lavori | 1 |

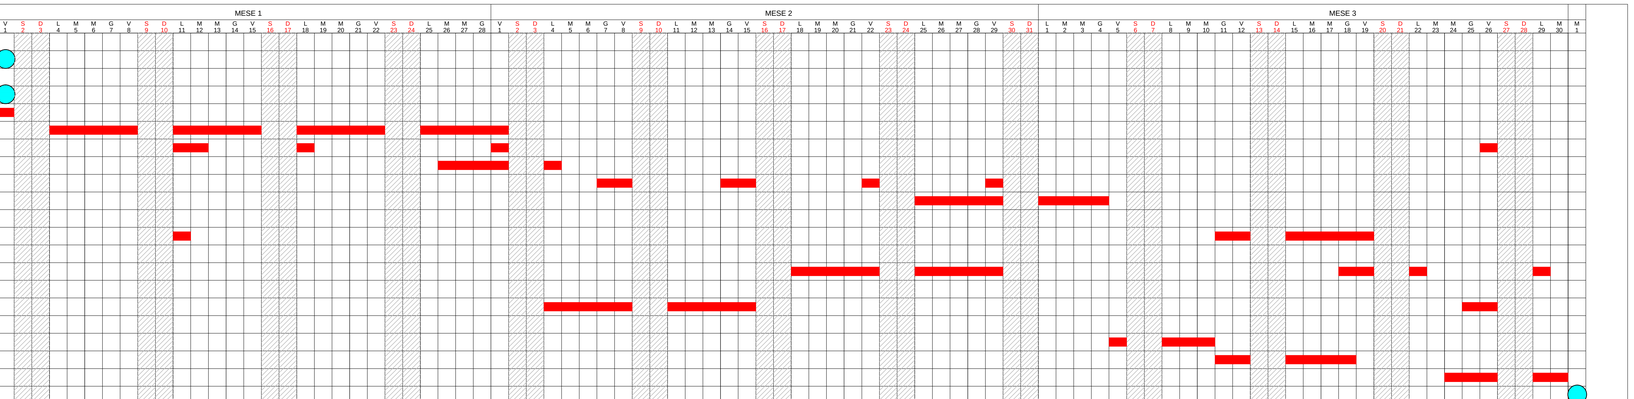


TOTALE GIORNI LAVORATIVI CONSECUTIVI 90

## Individuazione dei lavoratori aut. ed imprese operanti in cantiere

| Nr. | LAVORATORE AUTONOMO O IMPRESA |
|---|---|
| 1 | Impresa aggiudicataria EDILE |
| 2 | Impresa elettricista |
| 3 | Impresa opere termoidrauliche - meccaniche |
| 4 | C.S.E. |
| 5 | Impresa istallazione ascensore |
| 6 | OS6 Finiture generali |

VISITA IN CANTIERE PROGRAMMATA PRELIMINARMENTE

COMUNE DI MALCESINE

MESSA A NORMA E RIQUALIFICAZIONE INFRASTRUTTURALE E EDIFICI COMUNALI - (EX) AUTOSTAZIONE, PREDISPOSIZIONE RISTRUTTURAZIONE PIANO INTERRATO PER FORMAZIONE BAGNI PUBBLICI E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE LOTTO 2

IL R.U.P.
DOTT. ING. FRANCESCO MISDARIS

Cronoprogramma dei lavori
Stato di progetto
Scala e data

gen 2017

ET 420 03

Giuseppe Giuliani Studio di ingegneria
